



DÉPARTEMENT  
**Finistère**  
Penn-ar-Bed




**PLAN VÉLO**

# UN EFFORT FINANCIER MULTIPLIÉ PAR 8


**30 M€** SUR LA PÉRIODE 2022-2028 :

- **20 M€** EN MAÎTRISE D'OUVRAGE
- **10 M€** VIA LE PACTE FINISTÈRE 2030

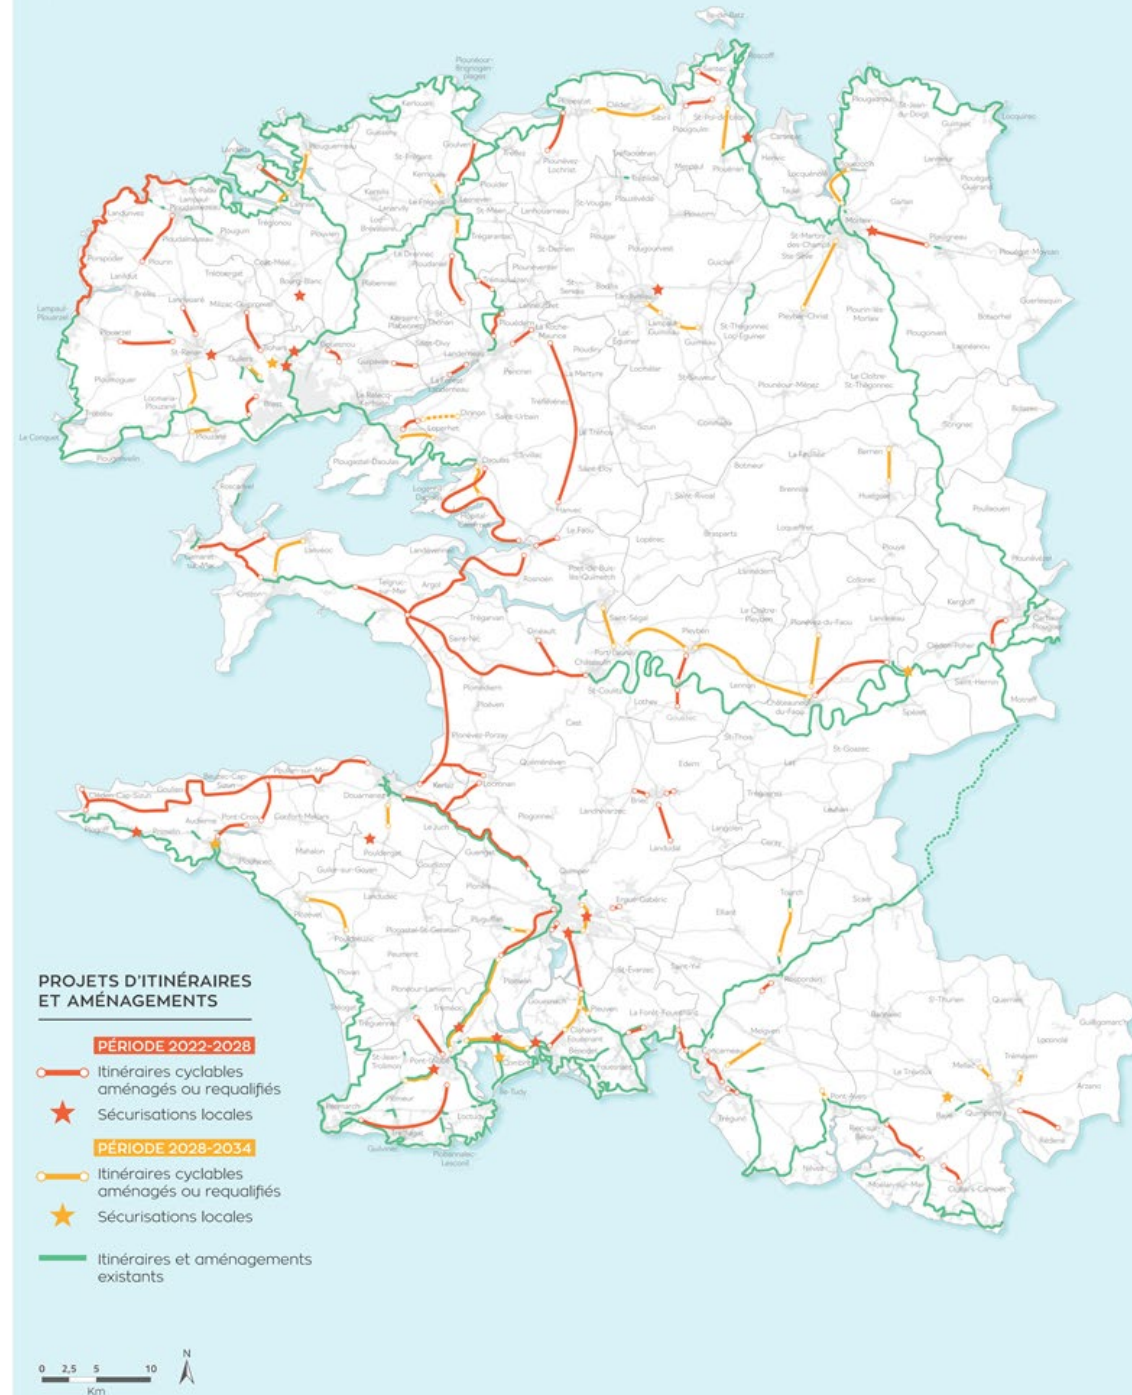


# UN RYTHME D'INVESTISSEMENT SOUTENU DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT

Montants des investissements réalisés dans les aménagements cyclables (M€)

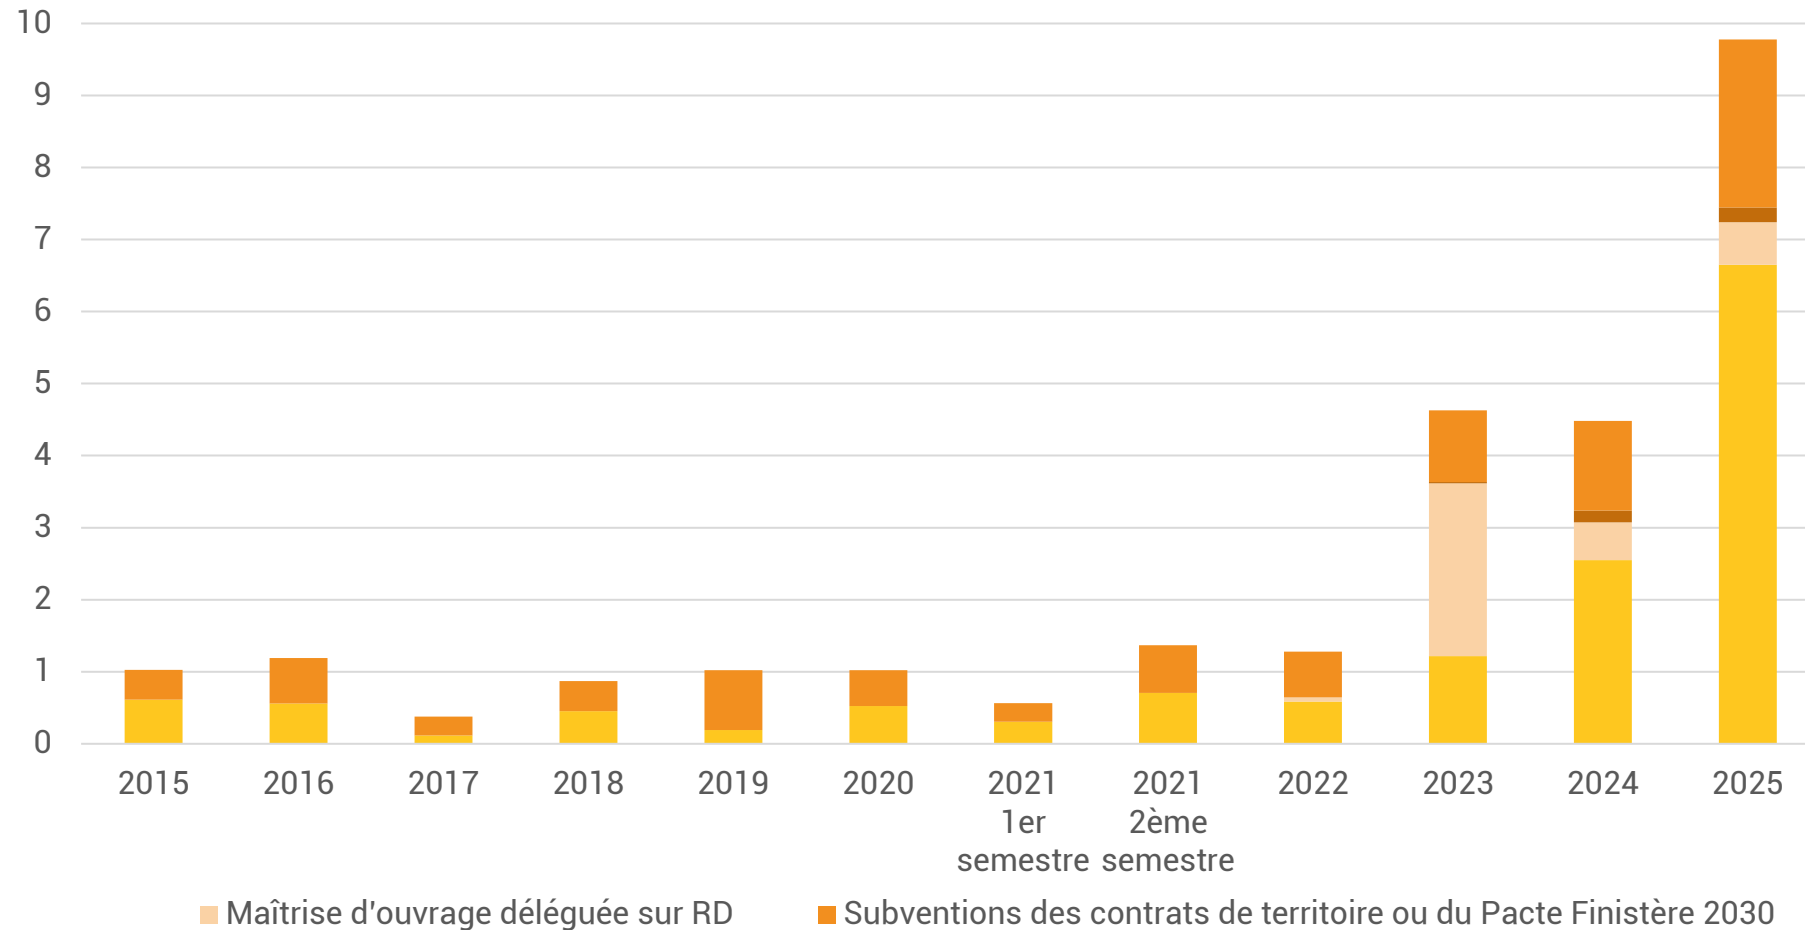


# LE DÉPARTEMENT EST EN AVANCE SUR LE PLAN CONVENU


Cumul des investissements depuis mi-2021 (M€)

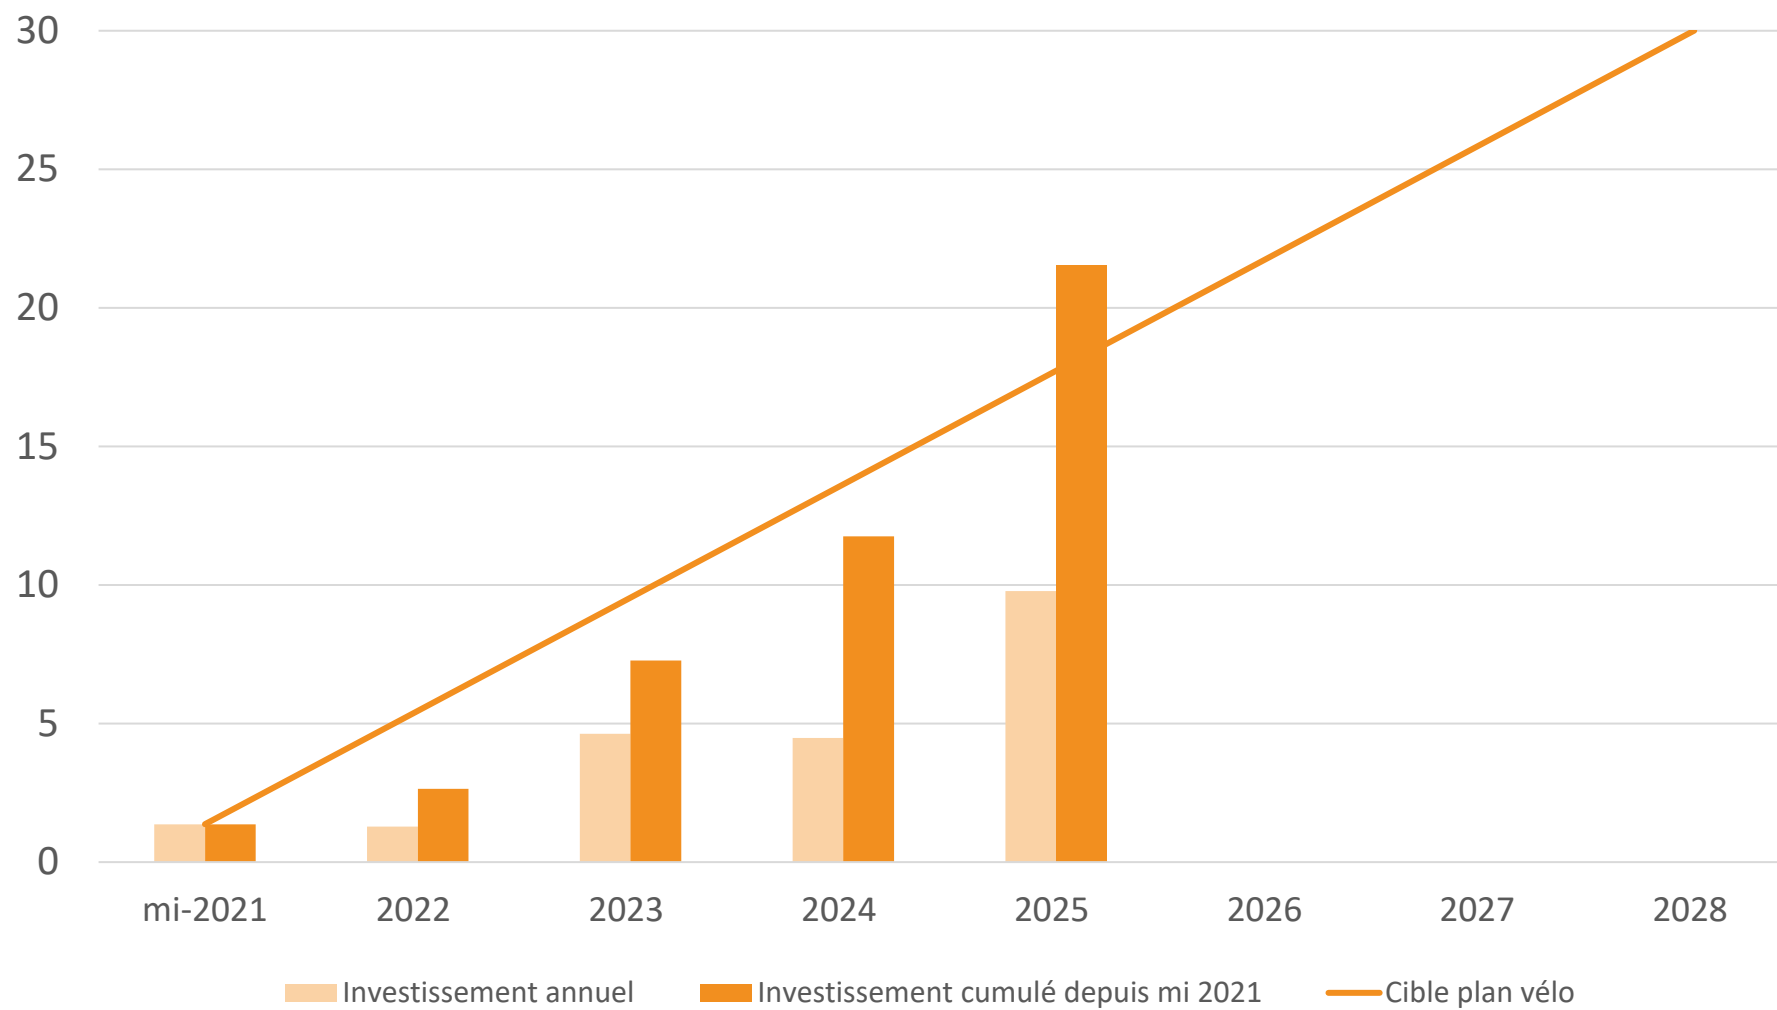

# PRÈS DE 80 % DU LINÉAIRE VISÉ SUR LA PÉRIODE 2022-2028 EST RÉALISÉ OU EN TRAVAUX / ÉTUDE (1/2)


## ITINÉRAIRES DÉPARTEMENTAUX

-  Itinéraires et aménagements existants
-  Itinéraires et aménagements réalisés, en travaux ou en études
-  Sécurisations locales réalisées, en travaux ou en études
-  Itinéraires et aménagements à réaliser
-  Sécurisations locales à réaliser

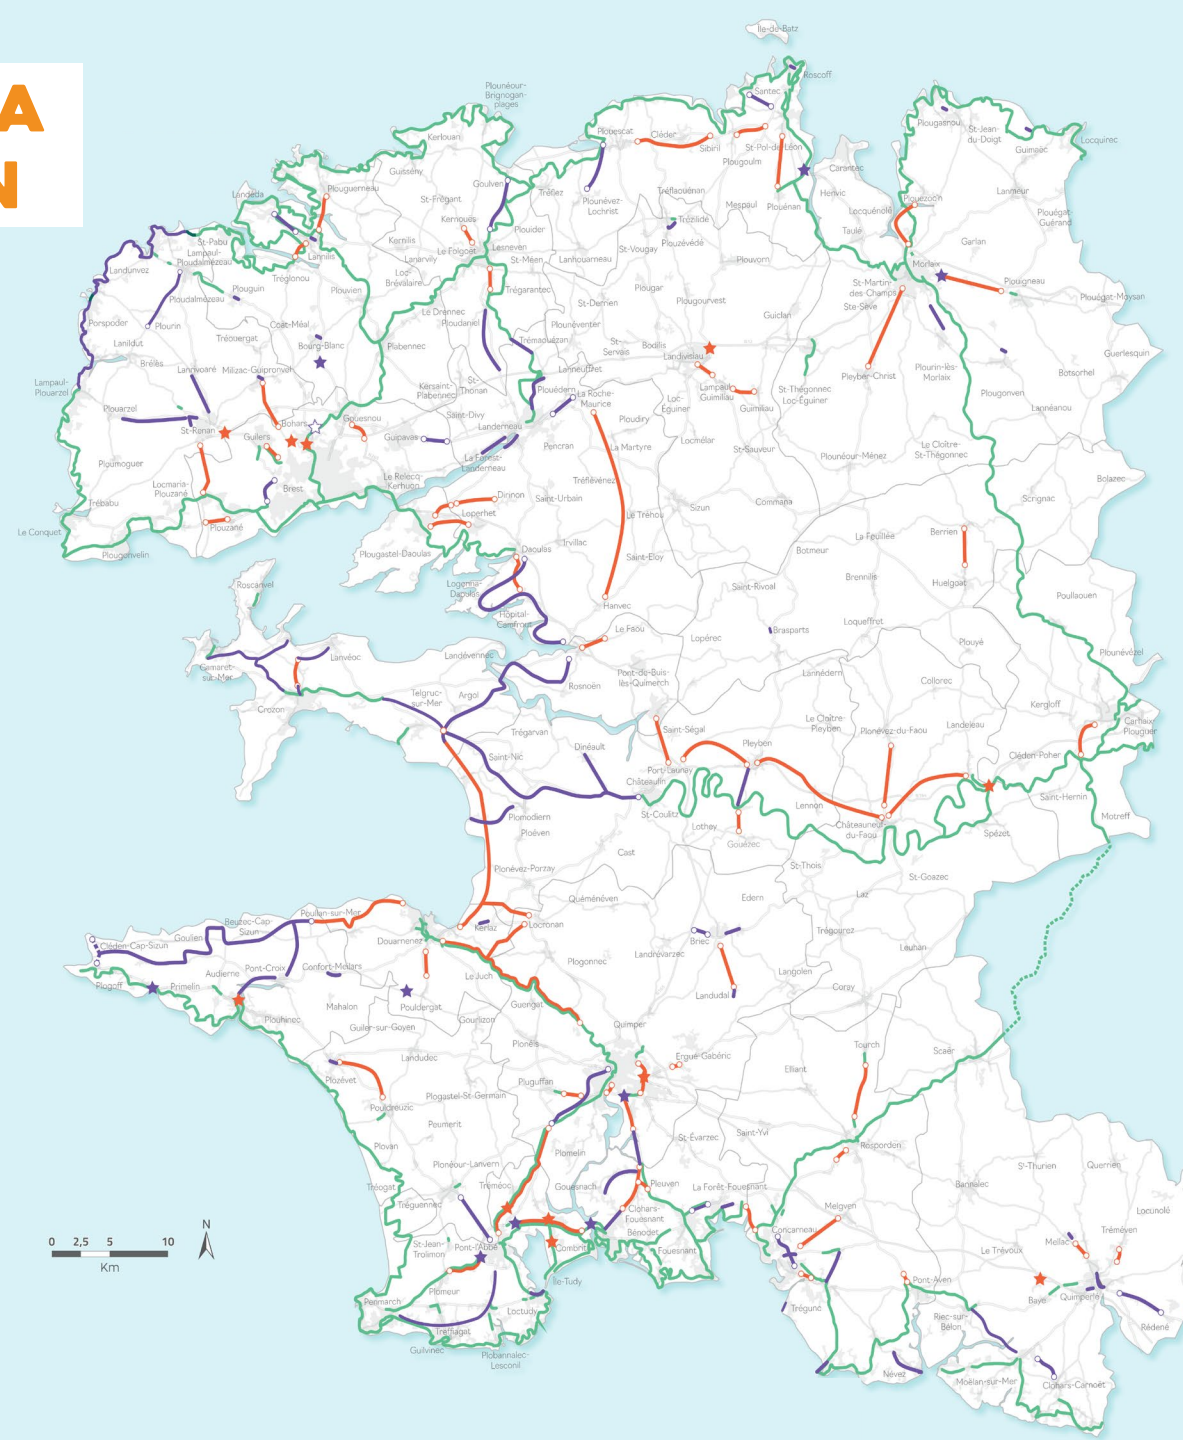

# PRÈS DE 80 % DU LINÉAIRE VISÉ SUR LA PÉRIODE 2022-2028 EST RÉALISÉ OU EN TRAVAUX / ÉTUDE (2/2)

- **80 %** DU LINÉAIRE SONT ENGAGÉS :
- **125 KM RÉALISÉS**
- **97 KM EN TRAVAUX**
- **103 KM EN ÉTUDES**

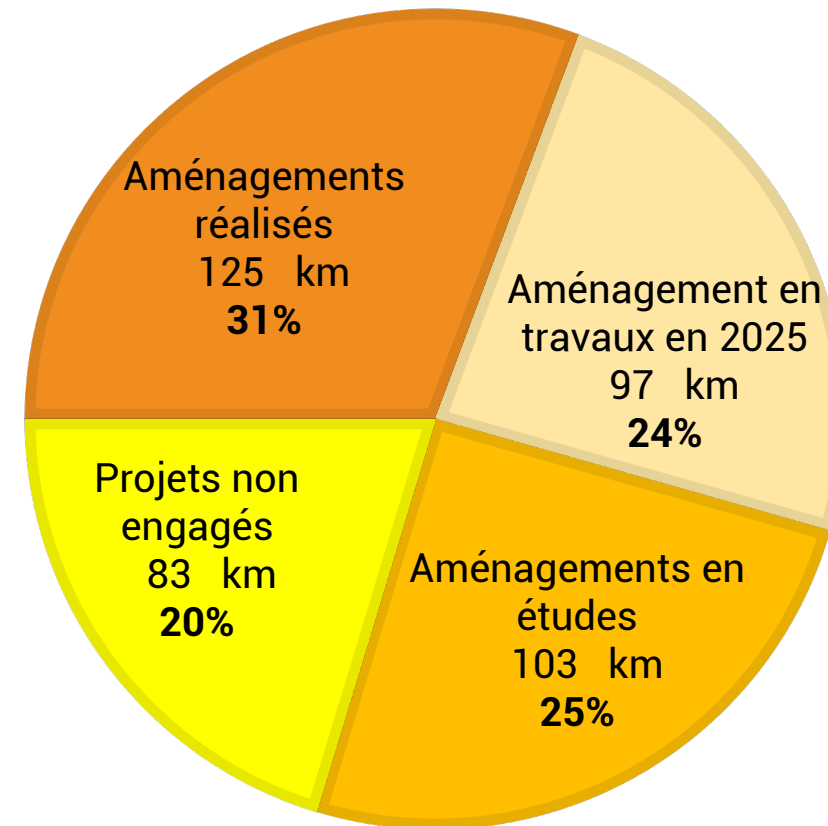

# AVANCEMENT DES RÉALISATIONS

## EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS

### **V45 - LA LITTORALE - RIEC-SUR-BELON - MOËLAN-SUR-MER**

**Aménagement de 7,5 km dont 2,7 km de voie verte et 1,8 km de chemins agricoles**

Finalisation de l'itinéraire de 55 km entre Concarneau et Le Pouldu


**Mise en service : juin 2024**

**Montant des travaux : 457 k€**

Département : 228,5 k€

Europe (FEDER) : 152 k€

Région : 76,5 k€

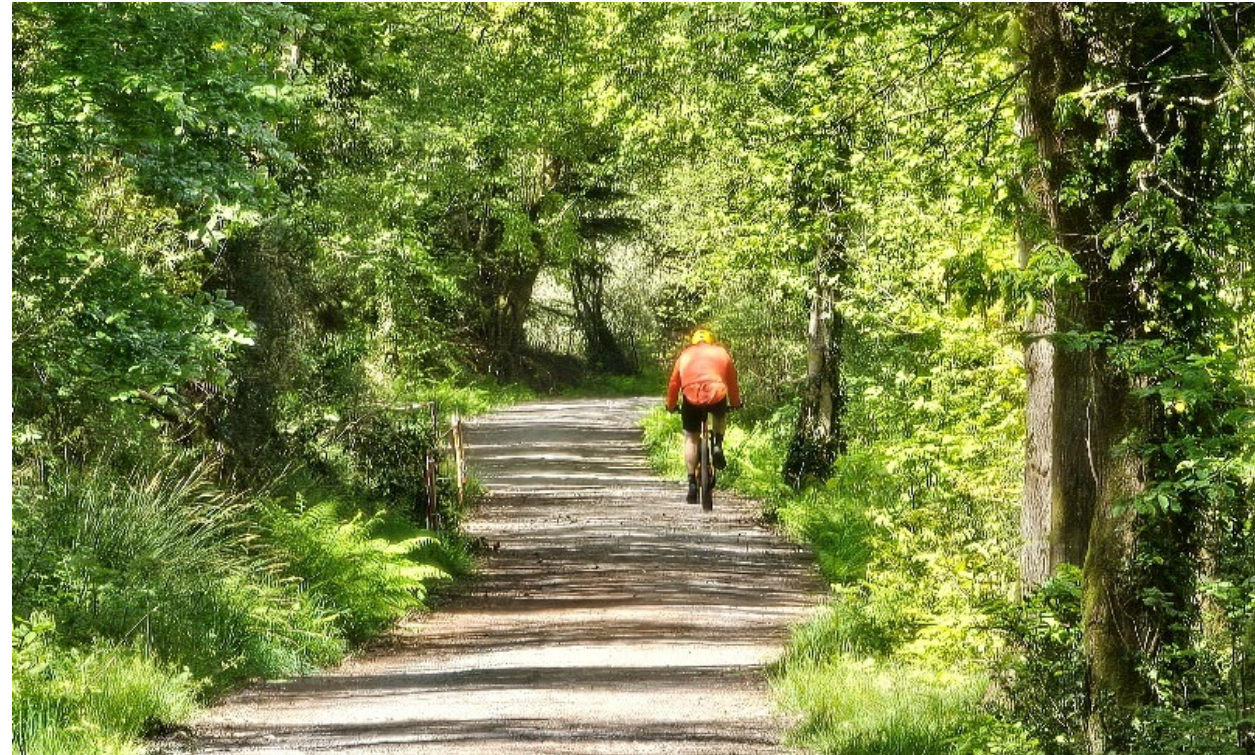

# AVANCEMENT DES RÉALISATIONS

## EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS

### **V45 - LA LITTORALE - PLOUGASTEL-DAOULAS - HANVEC**

**1 km de bandes et pistes cyclables le long de la RD770 à L'Hôpital-Camfrout et Hanvec**

**Mise en service : juin 2024**

**Montant des travaux : 450 k€**

Département : 360 k€

Région : 90 k€



# AVANCEMENT DES RÉALISATIONS

## EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS

### VOIE VERTE V6 - PRESQU'ÎLE DE CROZON

#### Aménagement de la voie verte V6 à Telgruc-sur-Mer

Dernière section des 29 km entre les ports de Camaret-sur-Mer et du Fret et Telgruc-sur-Mer

**Montant travaux 2024 : 169 k€**

Département : 136 k€

Région : 33 k€

Montant global de la V6 en Presqu'île : 4,45 M€



# AVANCEMENT DES RÉALISATIONS

## EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS

### PROJETS SOUS MOA LOCALE

#### **RD785 et voies communales : Liaison Pleyben – Pont-Coblant**

5 km dont 1,5 km sur RD

Coût total : 427 k€, participation du Département : 399 k€

#### **RD27 et RD5 : Liaison Saint-Renan – Plouarzel**

4,9 km dont 3,4 km sur RD

Coût total : 853 k€, participation du Département : 622 k€

#### **RD68 et voie communale : Liaison Saint-Renan – Lanrivoaré**

3,4 km dont 800m sur RD

Coût total : 558 k€, participation du Département : 269 k€



# AVANCEMENT DES RÉALISATIONS

## EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS

### PROJETS SOUS MOA LOCALE

#### **RD72 : Liaison Briec - Edern**

1,3 km sur RD

Coût total : 508 k€, participation du Département : 487 k€

#### **Itinéraire « train Birinik » entre Penmarch et Pont-l'Abbé**

19 km de voie verte ou voies partagées

Coût total : 1,1 M€, participation du Département : 415 k€



# AVANCEMENT DES RÉALISATIONS

## EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS EN TRAVAUX

### **RD 34 - SÉCURISATION ENTRE MOULIN DES LANDES À QUIMPER ET MOULIN DU PONT À PLEUVEN**

**Sécurisation de la RD34 entre Quimper et le Pays fouesnantais  
3,7 km, 3 giratoires, pistes cyclables et reprise de chaussée**

#### **Travaux :**

Septembre 2024 à fin juin 2025

**Montant des travaux : 3,8 M€**

Département : 1,7 M€

Ville de Quimper : 1,1 M€

CCPF : 55 k€

Europe (FEDER) : 487 k€

Etat (FMA): 492 k€



# AVANCEMENT DES RÉALISATIONS

## EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS EN TRAVAUX

### VOIE VERTE QUIMPER - PLUGUFFAN

#### Requalification d'une ancienne voie ferrée en voie verte :

- 9 km de section courante de voie verte
- 3 ouvrages à créer (2 passerelles et un passage inférieur sous RD56)
- 22 accès et intersections à créer ou à sécuriser
- 3 parkings
- 23 ouvrages à rénover

#### Montant de l'opération : 4,8 M€

Département 3 M€, QBO 1,4 M€, État (FMA) 320 k€

#### Travaux :

Travaux section courante / intersections / parkings : mars à juillet 2025

Prévisionnel travaux ouvrages : octobre 2025 à début 2026

Travaux espaces verts / mobiliers : automne 2025

Rénovation du pont-rail du Cosquer : démarrage mi-2026



# AVANCEMENT DES RÉALISATIONS

## EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS EN TRAVAUX

### **LIAISON LA ROCHE-MAURICE - PENCRAAN VERS LE COLLÈGE CHARLES DE GAULLE DE LANDERNEAU**

**Création de 800 m de piste cyclable et sécurisation  
de 2,3 km de voie communale**

**Montant de l'opération : 522 k€**

**Travaux de mars à juillet 2025**



